

週 間 工 程 表

工事名：R4国道17号上尾(2)電線共同溝工事

雨天の場合は順延


工種	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	備 考				
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
管路工(電線共同溝)	休み					休み	休み						休み	休み	下り線				
プレキャストボックス工																			
導通試験(全線)																			

緑 施工済み

プレキャストボックス工 9月26日(火)

管路工 9月25日(月)

管路工 9月19日(火)~9月22日(金)

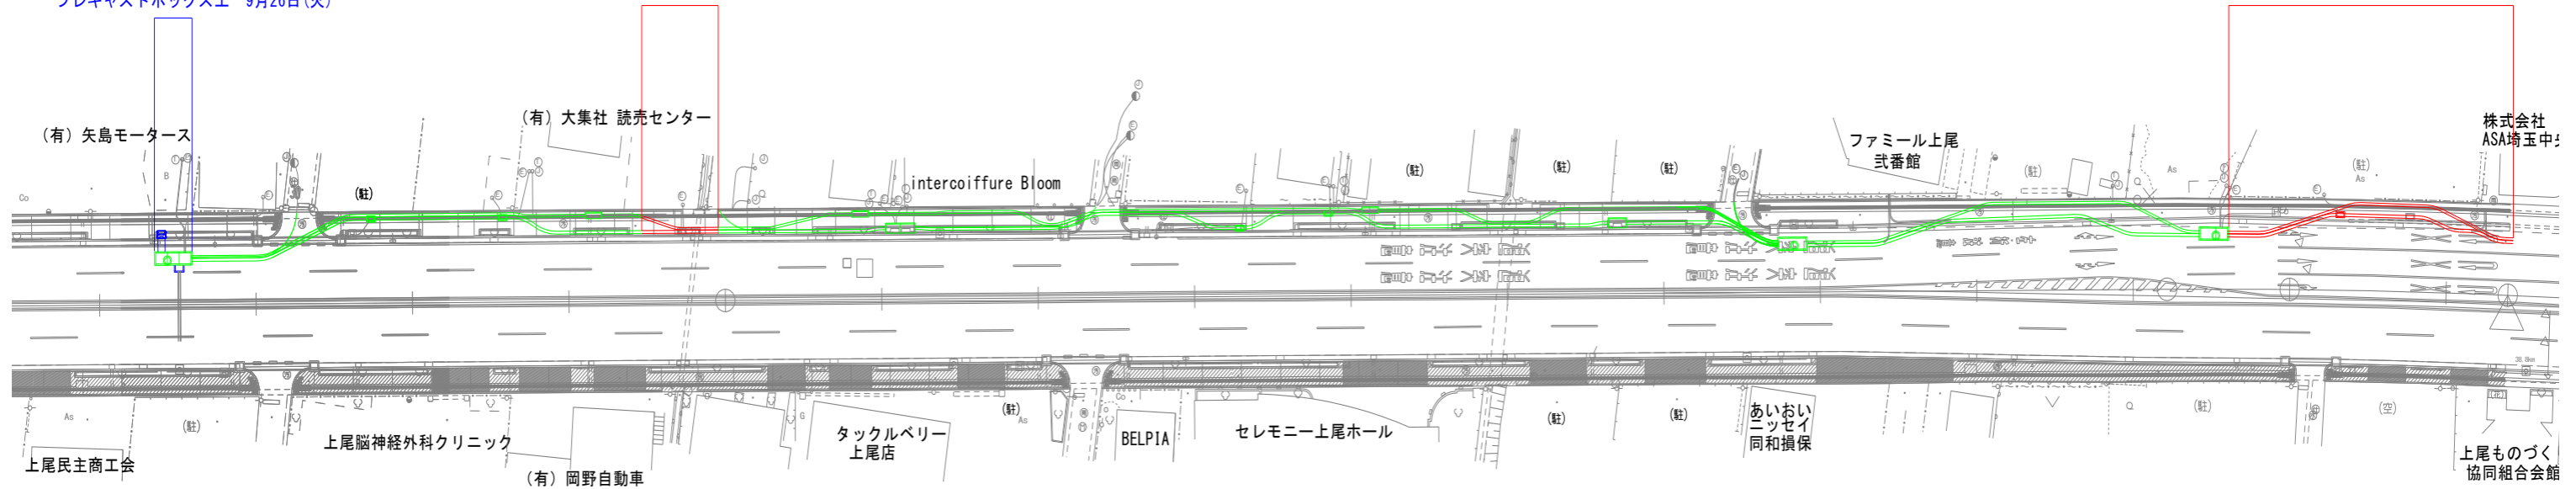

至 大宮

至 熊谷 / 桶川

